美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司 · 计划 SOP 流程清单


流程编号	流程名称
MSE008	月度产能规划开单流程
MSE013	车间排产流程
MSE014	发放 MES 派工流程
MSE015	发放 WMS 备料流程

共 4 个流程

美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE008	建立人：张盼盼	建立日期：2026.09.07	职能部门：计划、采购	相关部门确认签字：	
流程名称：月度产能规划开单流程	修订人：张盼盼	修订日期：2026.09.07	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：对订单需求进行冲销后执行物料规划，检视订单达交与供需平衡；将 APS 规划结果（建议新开工单、建议新开采购令）回抛 E10，在 E10 下发成已审核的工单、采购订单。

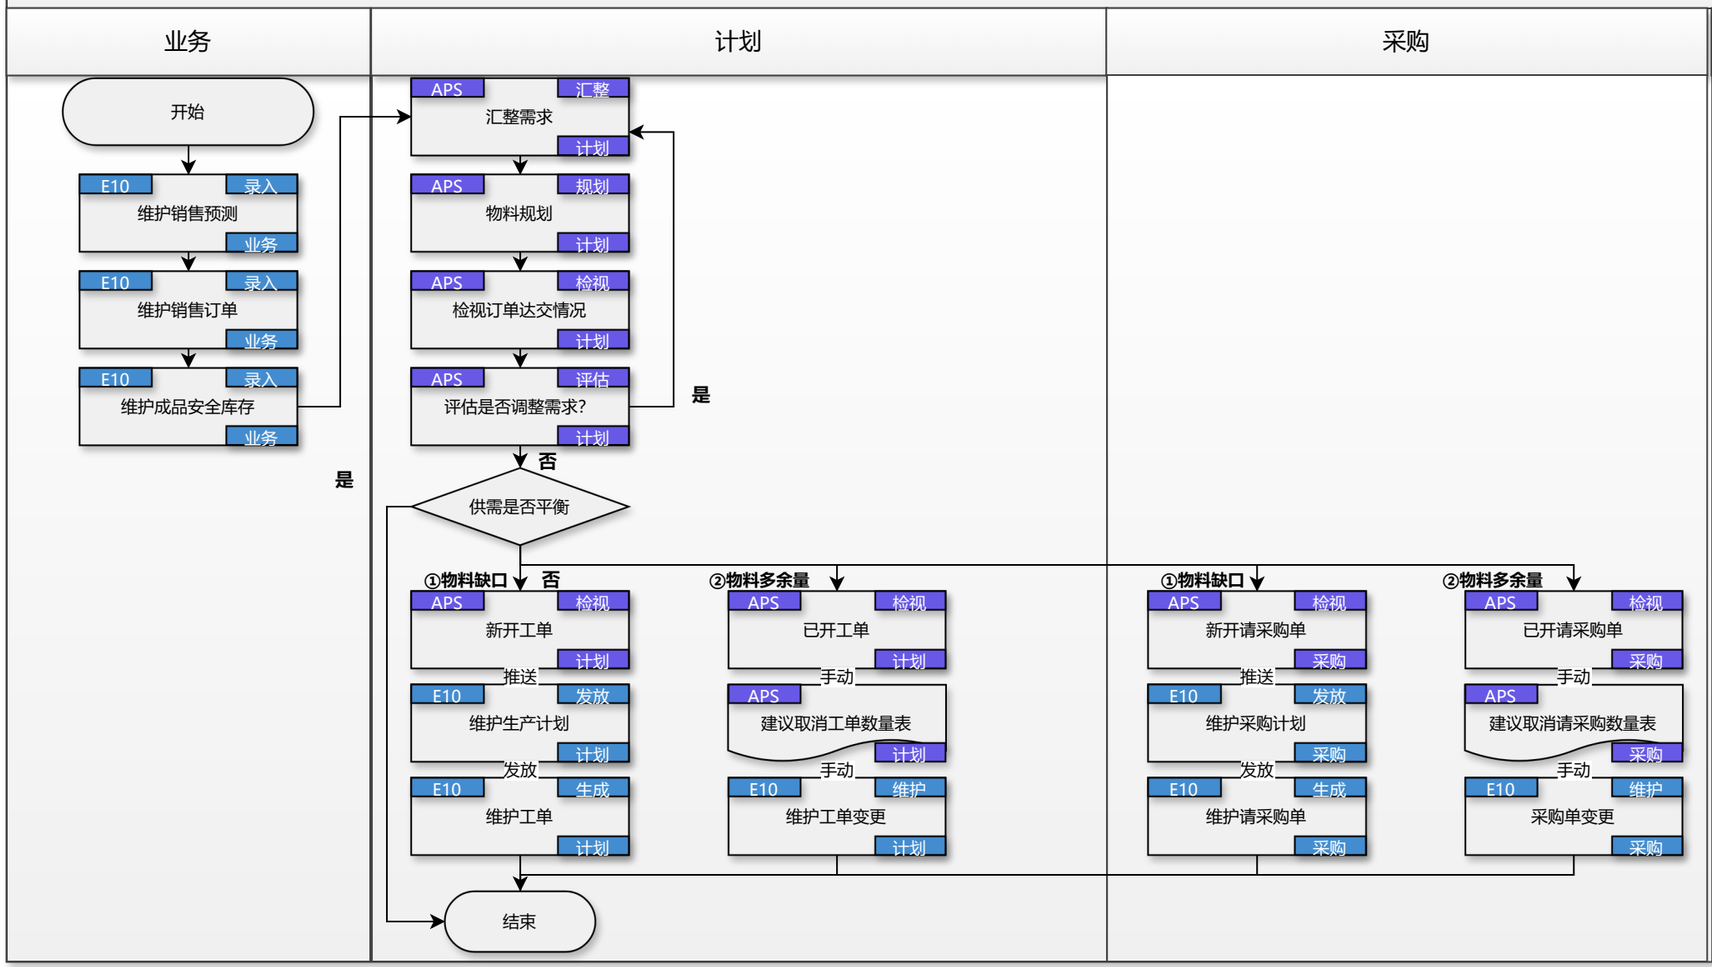

关键作业说明

场景：每月由业务在 E10 维护销售预测、销售订单与成品安全库存；计划在 APS 汇整需求并执行物料规划，检视订单达交与供需平衡后确认生产、采购计划，并回抛 E10 下发。

1. 需求维护：业务在 E10 维护销售预测（预估下一生产周期销售量）、销售订单（客户实际需求）与成品安全库存（撇除预测及订单外应预留的库存）。
2. 汇整与规划：打开 APS 选定规划版本 MSE-MCP，汇整 MDS 需求（MDS007）并新建 APS 储存版本，在 MDS 汇整结果维护作业（MDS009）按冲销后订单优先权排序（可人工调整）后执行【物料规划】。
3. 检视：以订单交期总表（RPT007）结合现有物料供给与制造加工周期推算订单交货日；以品项需求明细表（MRP109）检视需求—供给配置是否平衡。
4. 需调整需求时：由计划协调业务调整未完工订单的需求日期或需求数量，放弃本版本结果，回到「汇整需求」重新规划。
5. 回抛与下发：批次勾选变更作业（CPT019，不勾选则全部回抛）回抛新开工单（RPT010）、新开采购令（RPT011）；版本确认后资料即锁定，计划、采购在 E10 发放生产计划、采购计划并转成正式工单、请采购单。
6. 供需不平衡时：
   ① 物料缺口：APS 新开工单、新开请采购单，计划、采购校验后推送 E10 维护生产、采购计划并发放，生成正式工单、请采购单
   ② 物料多余：计划、采购参考 APS 建议，手动调整已开工单、已开请采购单数量 / 日期形成取消清单，E10 维护工单变更单、采购单变更

变更后务必重跑 APS，同步最新数据再排程。

标准图例




美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE013	建立人：张盼盼	建立日期：2026.09.07	职能部门：计划	相关部门确认签字：	
流程名称：车间排产流程	修订人：张盼盼	修订日期：2026.09.07	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：基于现有资源产能，制定未来 N 天生产工单排产计划；调整设备与模具资源安排，检视每日生产计划并跟催物料，版本确认后推送 MES、WMS。


计划	采购	关键作业说明

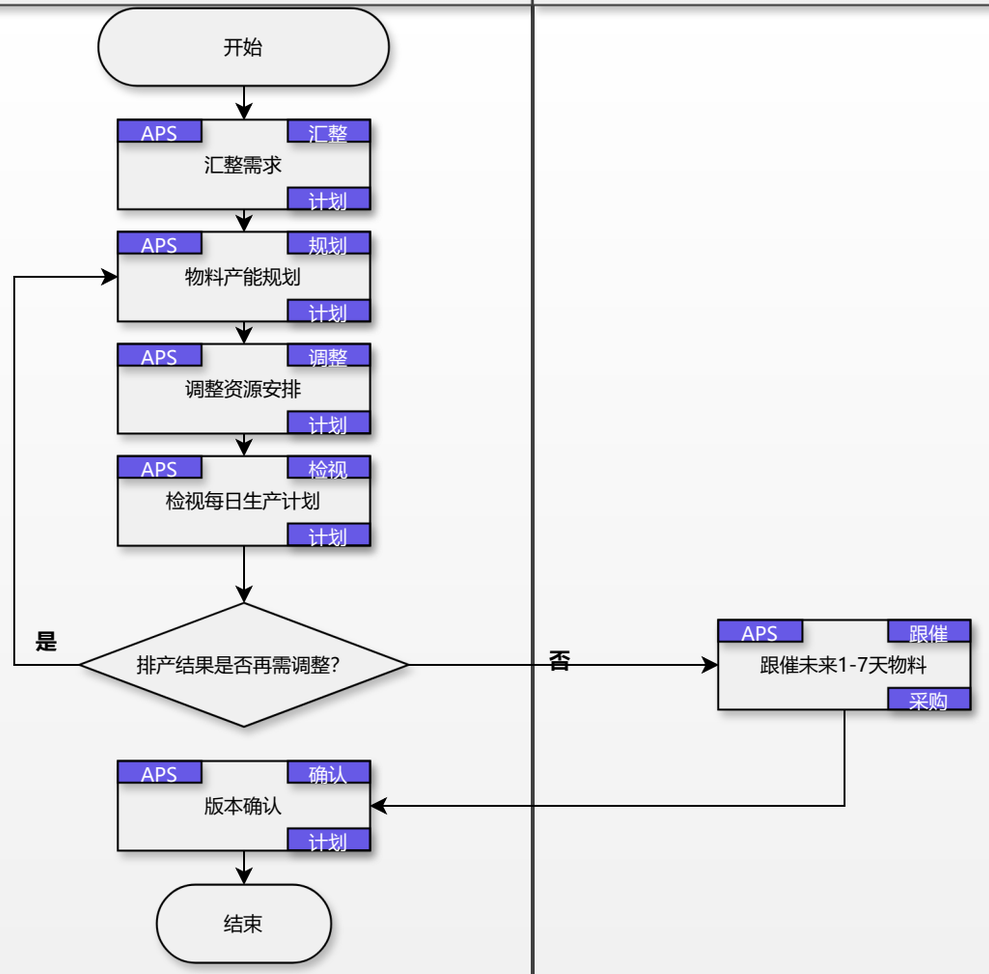

场景：每天由计划在 APS 基于现有资源产能制定未来 N 天生产工单排产计划，调整设备与模具资源、检视每日生产计划并跟催物料，版本确认后推送 MES 与 WMS。

1. 排程准备：打开 APS 选定规划版本 MSE-APS1，汇整 MDS 需求（MDS007）并新建 APS 储存版本，在 MDS 汇整结果维护作业（MDS009）执行【物料产能规划】。
2. 资源安排：维护机台（DAT030）、日行事历（DAT029）、周行事历（DAT054）、加班保修（DAT088）与模具保修（DAT051），线下收集、系统录入，覆盖未来 1-3 天设备与模具资源安排。
3. 计划检视：以每日生产计划（RPT032）检视生产安排合理性、物料齐套与模具满足状况；需调整时通过手调界面（调整工序计划 CPT027）调整未来一周工单生产顺序与所用机台，如有调整必须重排。
4. 物料跟催：计划、采购依工单物料短缺表（RPT092）共同跟催未来 1-7 天物料。
5. 版本确认后推送排产计划至 MES（派工依据）、物料需求计划至 WMS（送料依据），详见 MSE014、MSE015 流程。

标准图例




美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE014	建立人：张盼盼	建立日期：2026.09.07	职能部门：计划	相关部门确认签字：	
流程名称：发放 MES 派工流程	修订人：张盼盼	修订日期：2026.09.07	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：基于APS运算出来的排程结果，将工单排产的细化结果（生产批 / 派工底稿）传给 MES，作为 MES 派工依据。

计划	生产	关键作业说明

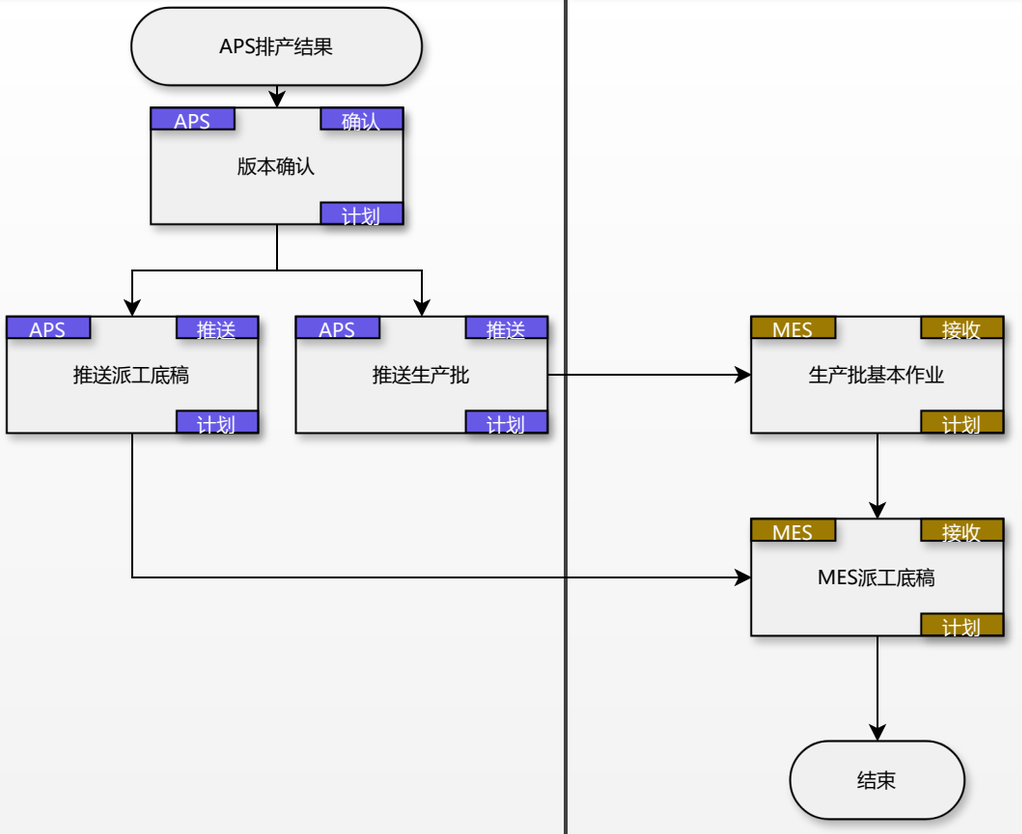

场景：版本确认后，每日由计划在 APS 将生产批与派工底稿并行推送至 MES，作为车间派工依据。

1. 在 APS 中【MSE013 车间排产】流程已完成资料锁定并点击版本确认，在 APS 版本确认页勾选【是否下发MES生产批】；支持定时推送。
2. 推送生产批——根据工单排产计划，APS 推送未来 1 天的生产批给 MES。
3. 推送派工底稿——每日生产计划推送至 MES 派工底稿，自动推送、无需勾选。
4. 接收与执行——MES 接收生产批与派工底稿，作为派工依据下发车间执行。

标准图例




美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE015	建立人：张盼盼	建立日期：2026.09.07	职能部门：计划	相关部门确认签字：	
流程名称：发放 WMS 备料流程	修订人：张盼盼	修订日期：2026.09.07	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：基于APS运算出来的排程结果，将物料需求计划给 WMS 做送料依据。

计划	仓库	关键作业说明

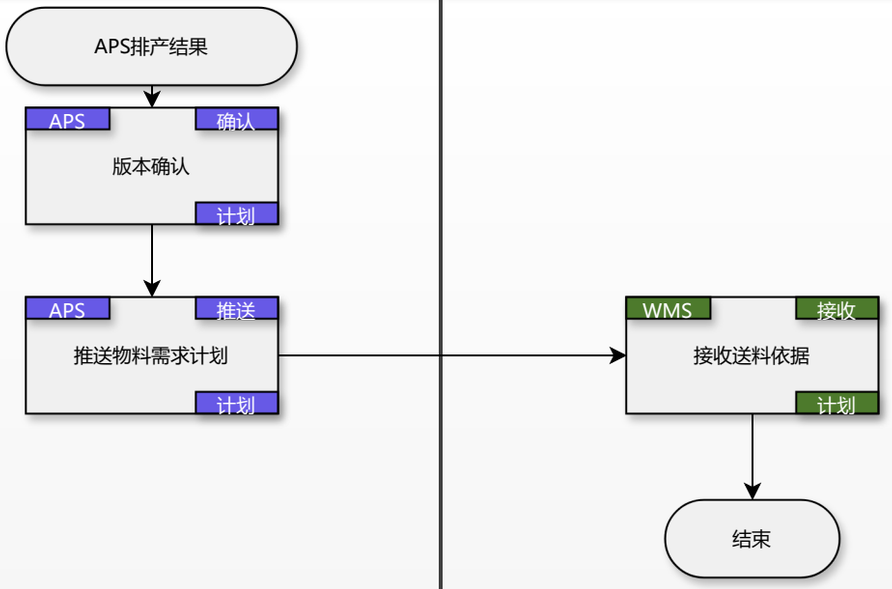

场景：版本确认后，每日由计划在 APS 将物料需求计划推送至 WMS，作为备料与送料依据。

1. 在 APS 中完成【MSE013 车间排产】流程，进行【资料锁定】并点击【版本确认】，在 APS 版本确认页勾选【是否下发 WMS】；支持定时推送。
2. 推送物料需求计划——根据工单排产计划计算各物料需求计划（MSE001），并推送给 WMS。
3. 接收与执行——WMS 以物料需求计划作为送料依据，安排备料与送料。

标准图例

